

PROYECTO AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE ESPACIOS ESCOLARES EN 108 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MEC EN ASUNCIÓN Y 10 DEPARTAMENTOS



OBJETIVO: Culminar las obras iniciadas en 108 establecimientos educativos según los requerimientos pedagógicos y socioculturales.

DATOS GENERALES

Periodo reportado	Desde: 01/01/2022	Hasta: 30/06/2022
Unidad ejecutora	Ministerio de Educación y Ciencias – MEC	
Recursos aprobados	₡ 46.134.643.694	
Fecha de inicio	22/12/2014	Fecha de finalización 31/12/2022 - Según Resolución CAFEEI N° 25/2021

ESTADO DEL PROYECTO¹

Gráfico 1: Recursos aprobados, comprometidos y ejecutados acumulados al 30/06/2022 en ₡	Gráfico 2: Recursos aprobados y ejecutados acumulados al 30/06/2022 en ₡
---	--

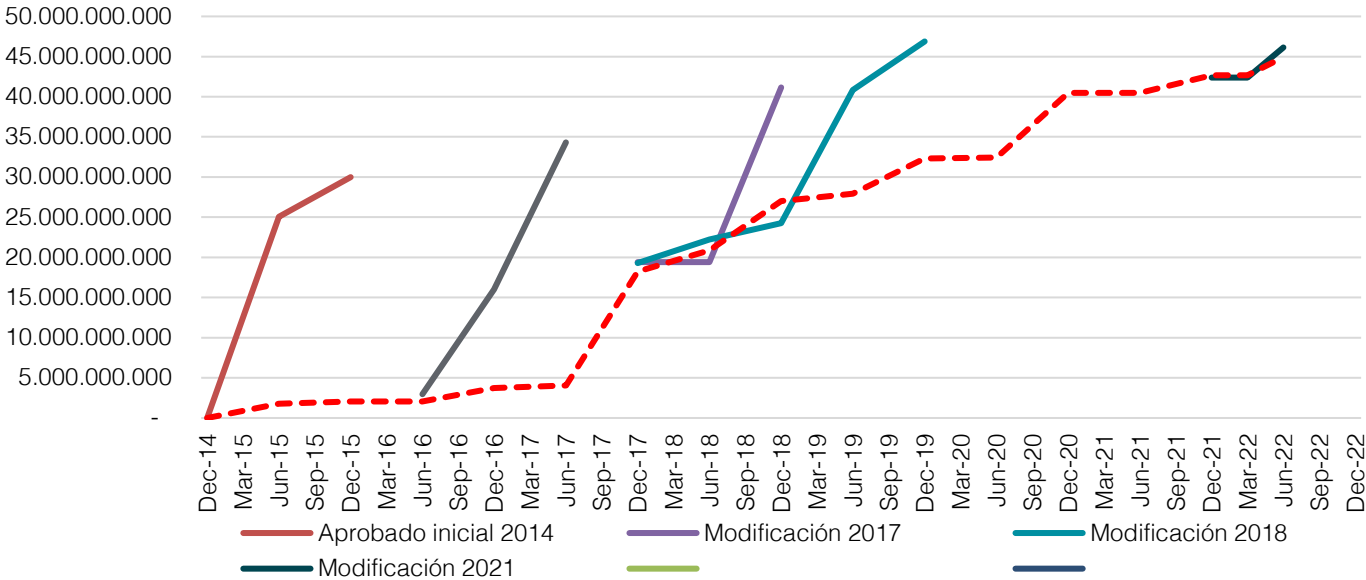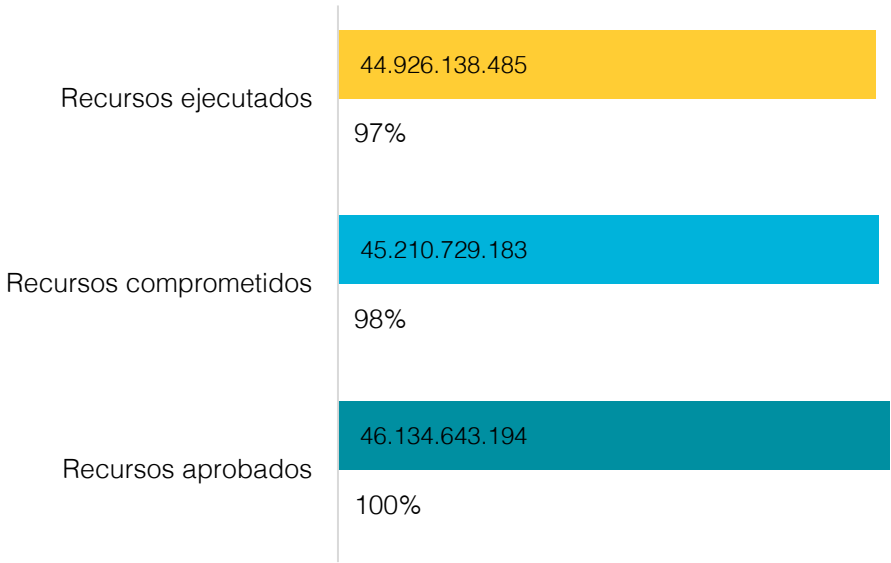

¹ La ejecución registrada corresponde a lo efectivamente pagado por la Agencia Financiera de Desarrollo AFD (fiduciaria)

RESUMEN DE METAS FÍSICAS Y MONTOS EJECUTADOS POR COMPONENTES Y ACTIVIDADES AL 30/06/2022 EN ₡

EDT	COMPONENTES / PRODUCTOS	METAS DEL PROGRAMA	METAS ACUMULADAS PLANIFICADAS AL 30/06/22	METAS ACUMULADAS LOGRADAS AL 30/06/22	METAS LOGRADAS EN EL SEMESTRE	RECURSOS APROBADOS	RECURSOS COMPROMETIDOS ACUMULADOS AL 30/06/22	RECURSOS EJECUTADOS ACUMULADOS AL 30/06/22
TOTAL, PROGRAMA/PROYECTO						46.134.643.694	45.210.729.183	44.926.138.485
Componente 1: Ampliación, reposición y equipamiento de la infraestructura escolar						42.461.046.777	42.100.545.302	42.100.545.302
1.1	Construcción y reparación de la infraestructura escolar.	108	108	95	5	41.747.046.777	41.617.258.502	41.617.258.502
1.2	Equipamiento mobiliario	2	2	8	0	714.000.000	483.286.800	483.286.800
Componente 2: Fiscalización y supervisión de obras						3.097.386.917	2.690.593.183	2.690.593.183
2.1	Fiscalización de obras	80	108	111	0	2.016.386.917	1.891.736.872	1.891.736.872
2.2	Viáticos	N/A	N/A	N/A	0	604.800.000	363.148.032	363.148.032
2.3	Combustibles	N/A	N/A	N/A	0	151.200.000	143.758.279	143.758.279
2.4	Contratación de personal	5	3	0	0	325.000.000	291.950.000	291.950.000
Componente 3: Auditoría externa (auditoría financiera y técnica)						576.210.000	419.590.698	135.000.000
3.1	Auditoría financiera y operativa	8	4	0	0	455.000.000	135.000.000	135.000.000
3.2	Auditoría técnica de construcción (30% muestreo).	40	0	0	0	121.210.000	284.590.698	0
Componente 4: Seguimiento y monitoreo						0	0	0
4.1	Seguimiento y monitoreo	N/A	N/A	N/A		0	0	0
TOTAL, PROYECTO						46.134.643.694	45.210.729.183	44.926.138.485

La ejecución registrada en este cuadro, corresponde a los datos proveídos por el SICO

PRINCIPALES COMENTARIOS DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FEEI

ESTADO	AVANCE ACUMULADO
En ejecución	2
Recepción provisoria	1
Recepción definitiva	21
Inscriptas en patrimonio	84
TOTAL	108

*Actualizado hasta la última revisión en agosto del 2022

PRINCIPALES CONSIDERACIONES

El proyecto finaliza en diciembre del 2022, y debe resolver los retrasos para viabilizar la culminación:

- Urge la inscripción en patrimonio del MEC de todas las obras concluidas con recepción definitiva.
- El plan de cierre del proyecto de 108 locales aún no ha sido presentado al CAFEEI para su aprobación.
- 1 local escolar con recepción provisoria del Consorcio Serra ubicada en Alto Paraná sigue sin recepción definitiva y 2 procesos judicializados sin avances: 1 contrato con la constructora ITASA. Resolución N° 5666/2019 y 1 contrato con la Constructora BGF con resolución N° 814/2020
