

PROGRAMA “AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE ESPACIOS ESCOLARES EN 822 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MEC, EN ASUNCIÓN Y LOS 17 DEPARTAMENTOS GEOGRÁFICOS DEL PAÍS” – PROYECTO 822

OBJETIVO: Mejorar la infraestructura edilicia de 822 establecimientos educativos

DATOS DEL PROGRAMA VIGENTE

Periodo reportado	Desde: 01/07/2022	Hasta: 31/12/2022
Unidad ejecutora	Ministerio de Educación y Ciencias – MEC	
Recursos aprobados	G 573.369.007.358	
Fecha de inicio	17/03/2015	Fecha de finalización 30/06/2023 según Resolución CAFEEL N° 14/2021

ESTADO DEL PROYECTO

Gráfico 1: Recursos aprobados, comprometidos y ejecutados* acumulados al 31/12/2022, en G


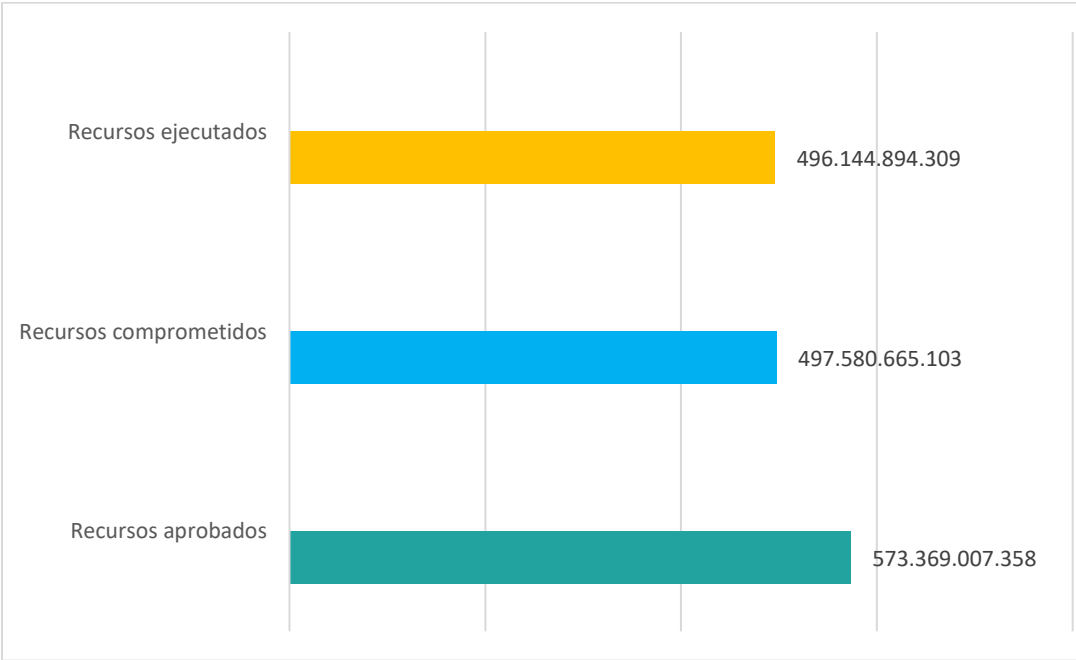


Gráfico 2: Recursos aprobados y ejecutados acumulados al 31/12/2022, en G

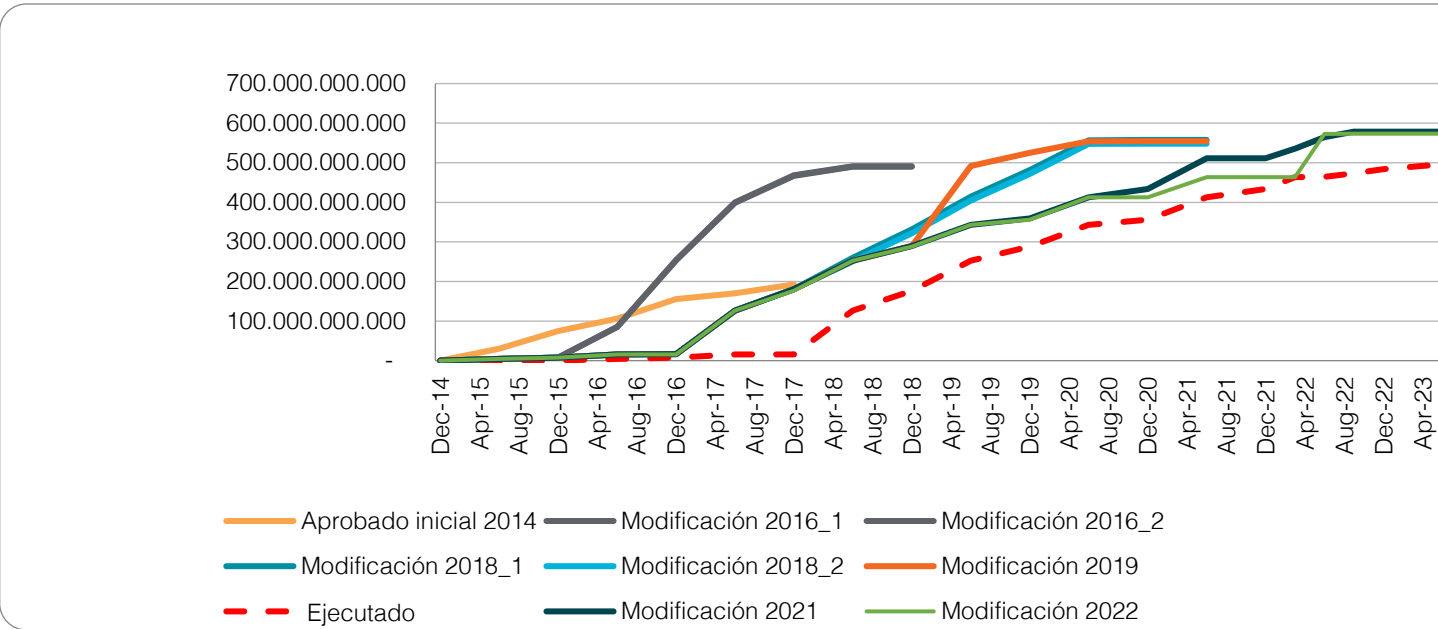

*La ejecución registrada corresponde a lo efectivamente pagado por la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD, fiduciario).

RESUMEN DE METAS FÍSICAS Y MONTOS EJECUTADOS* POR COMPONENTE Y SUBCOMPONENTE ACUMULADOS AL 31/12/2022, EN €

EDT	COMPONENTES / PRODUCTOS	METAS DEL PROGRAMA	METAS ACUMULADAS PLANIFICADAS al 31/12/22	METAS ACUMULADAS LOGRADAS 31/12/22	METAS LOGRADAS EN EL SEMESTRE	RECURSOS APROBADOS (abril 2022)	RECURSOS COMPROMETIDOS (desde el inicio al 31/12/2022)	RECURSOS EJECUTADOS ACUMULADOS
	TOTAL, PROGRAMA/PROYECTO					573.369.007.358	497.580.665.103	496.149.912.527
1	COMPONENTE 1: Relevamiento, fiscalización y gestión de obras					34.090.273.303	29.216.682.238	28.159.482.286
1.1	Relevamiento edilicio y proyecto ejecutivo	822		822	0	79.800.894	79.800.894	79.800.894
1.1.1	Viáticos					60.042.307	60.042.307	60.042.307
1.1.2	Combustible					19.758.587	19.758.587	19.758.587
1.1.3	Relevamiento edilicio y proyecto ejecutivo						-	-
1.2	Movilidad	6	6	6	0	1.057.199.952	1.057.199.952	1.057.199.952
1.2.1	Adquisición de 6 camionetas 4x4					1.018.200.000	1.018.200.000	1.018.200.000
1.2.2	Mantenimiento de 6 vehículos					-	-	-
1.2.3	Seguro vehicular para 6 unidades					38.999.952	38.999.952	38.999.952
1.3	Supervisión de obras	822	822	822	0	9.393.990.104	8.719.286.010	8.719.286.010
1.3.1	Viático					1.180.018.909	916.156.869	916.156.869
1.3.2	Combustible					596.964.049	410.325.377	410.325.377
1.3.3	Equipo de gestión y coordinación de Infraestructura					4.786.507.146	4.573.303.764	4.573.30.764
						676.000.000	665.000.000	665.000.000
						2.154.500.000	2.154.500.000	2.154.500.000
1.4	Fiscalización de obras	822	822	822	-	23.559.282.353	19.360.395.382	19.360.395.382
1.4.1	Firma fiscalizadora (Grupo 1 - 465)					19.191.282.353	17.449.794.184	17.449.794.184
1.4.2	Firma fiscalizadora (Grupo 1 - 272)					4.368.000.000	1.910.601.198	1.910.601.198
2	COMPONENTE 2: Ampliación de infraestructura y dotación de equipamiento					535.755.876.899	465.315.261.905	465.315.261.905
2.1	Obras Civiles	822	822	662	9	487.296.524.371	435.434.520.903	435.434.520.903
2.1.1	Obras (85 Locales) - Proyecto original (**)					24.018.101.479	24.018.101.479	24.018.101.479
2.1.2	Obras (465 Locales) - Proyecto Ajustado (*) (***)					344.690.595.093	337.675.864.954	337.675.864.954
2.1.3	Obras 272 - Proyecto ajustado					114.188.710.630	73.740.554.470	73.740.554.470

2.1.4	Obras (138 locales, adicionales expansiones)					1.401.769.367	-	-
2.1.5	Obras (29 locales - adicionales PROCEMA-IFD)					2.997.347.802	-	-
2.2	Equipamiento	822	822	483	0	48.459.352.528	29.880.741.002	29.880.741.002
2.2.1	Equipamiento de 822 locales					48.459.352.528	29.880.741.002	29.880.741.002
3	COMPONENTE 3:					3.522.857.156	3.048.720.960	1.617.968.384
3.1	Auditoría financiera y de gestión	4	4	4	-	630.000.000	292.800.000	155.600.000
3.2	Auditoría técnica de obras	272	0	0	-	2.292.857.156	2.155.920.960	862.368.384
3.3	Transferencia al proyecto "Apoyo operativo "					-	-	-
3.3.1	Gestión equipo					-		
3.3.2	Gestión administrativa y logística					-		
3.4	Transferencia para rendición y monitoreo externo FEEI (Resolución N° 20/2015)					600.000.000	600.000.000	600.000.000

*La ejecución registrada corresponde a lo obligado en el SICO

PRINCIPALES CONSIDERACIONES

- De los 822 locales, 662 tienen obras finalizadas (con recepción provisoria por lo menos). De las 160 en curso, se estima que 123 locales escolares no podrán culminar sus obras en el plazo previsto: 79 locales correspondientes a ex EISA, cuya fecha estimada de culminación es noviembre del 2023; 32 locales escolares de la empresa Engineering se estima estarían culminando las obras en diciembre del 2023; 12 locales escolares correspondientes al Consorcio Norteño, deberán hacer un nuevo llamado y se estima un plazo de ejecución hasta enero del 2024. Esto encarece la gestión y la disponibilidad de recursos, además del costo final real de la construcción.
- No cuentan con plan de cierre.
- Siguen sin entregar los informes de auditoría externa financiera y de gestión correspondientes a los años 2019, 2020, 2021 y 2022.
- Implementación de medidas correctivas en obras, como resultado de la auditoría forense, finalizarían en febrero del 2023 y deben presentar los reportes
