

PROGRAMA “AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE ESPACIOS ESCOLARES EN 822 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MEC, EN ASUNCIÓN Y LOS 17 DEPARTAMENTOS GEOGRÁFICOS DEL PAÍS” – PROYECTO 822

OBJETIVO: Mejorar la infraestructura edilicia de 822 establecimientos educativos

DATOS DEL PROGRAMA

Periodo reportado	Desde: 01/01/2022	Hasta: 30/06/2022
Unidad ejecutora	Ministerio de Educación y Ciencias – MEC	
Recursos aprobados	₡ 573.369.007.358	
Fecha de inicio	17/03/2015	Fecha de finalización 30/06/2023 según Resolución CAFEEI N° 14/2021

ESTADO DEL PROYECTO

Gráfico 1: Recursos aprobados, comprometidos y ejecutados* acumulados al 30/06/2022, en ₡


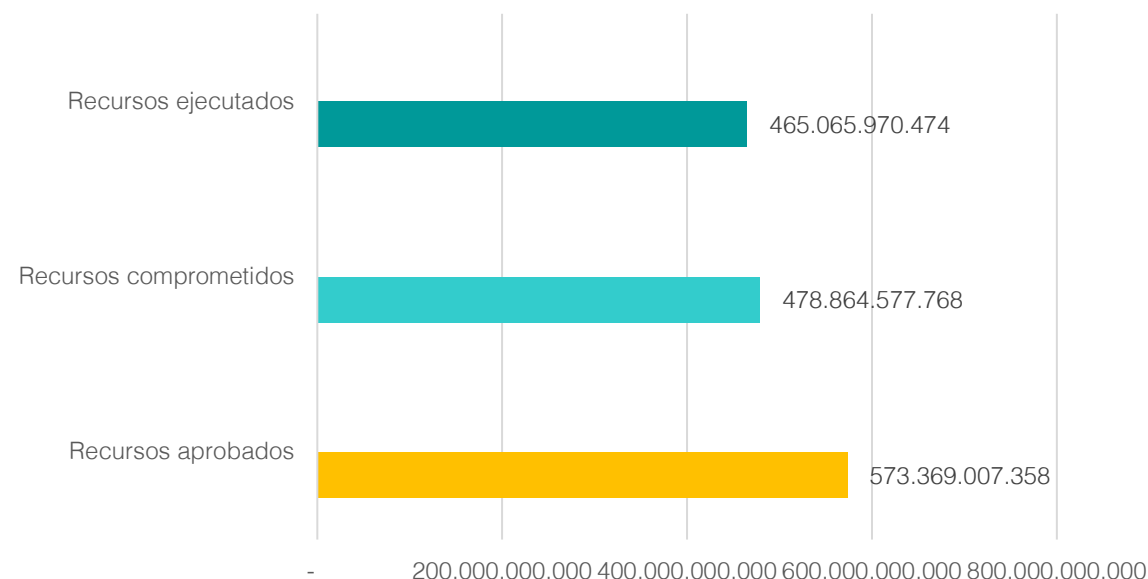


Gráfico 2: Recursos aprobados y ejecutados acumulados al 30/06/2022, en ₡

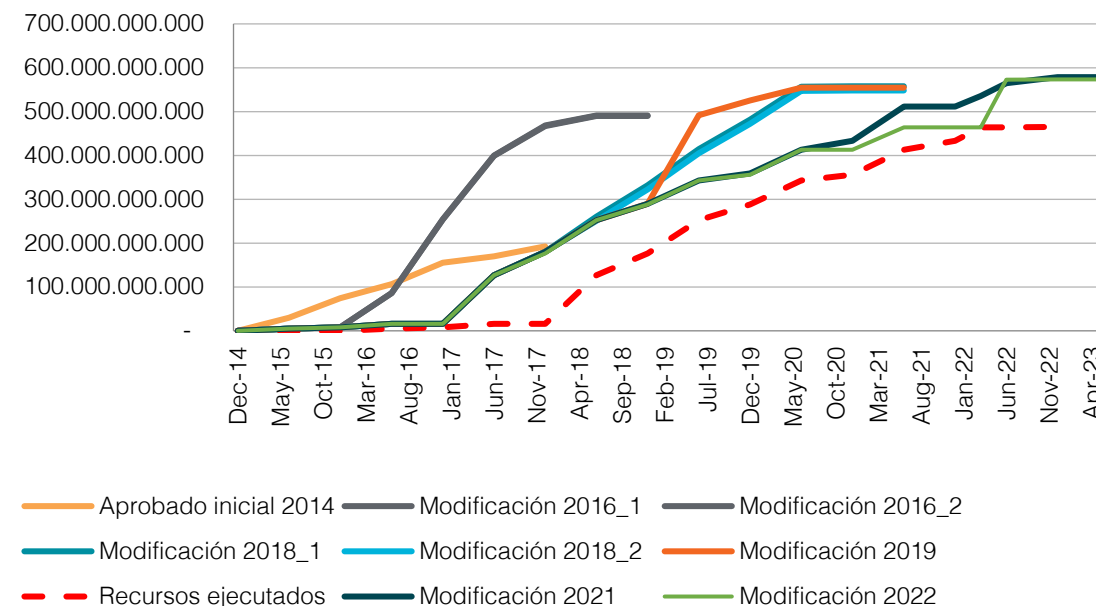

*La ejecución registrada corresponde a lo efectivamente pagado por la Agencia Financiera de Desarrollo AFD (fiduciario)

RESUMEN DE METAS FÍSICAS Y MONTOS EJECUTADOS* POR COMPONENTE Y SUBCOMPONENTE ACUMULADOS AL 30/06/2022, EN ¢

EDT	COMPONENTES / PRODUCTOS	METAS DEL PROGRAMA	METAS ACUMULADAS PLANIFICADAS al 30/06/22	METAS ACUMULADAS LOGRADAS 30/06/22	METAS LOGRADAS EN EL SEMESTRE	RECURSOS APROBADOS	RECURSOS COMPROMETIDOS (desde el inicio al 30/06/2022)	RECURSOS EJECUTADOS ACUMULADOS
	TOTAL, PROGRAMA/PROYECTO					573.369.007.358	478.864.577.768	475.971.720.612
1	COMPONENTE1: Relevamiento, fiscalización y gestión de obras					34.090.273.302	27.806.687.076	27.806.687.076
1.1	Relevamiento edilicio y proyecto ejecutivo	822		807	0	79.800.894	79.800.894	79.800.894
1.1.1	Viáticos					60.042.307	60.042.307	60.042.307
1.1.2	Combustible					19.758.587	19.758.587	19.758.587
1.1.3	Relevamiento edilicio y proyecto ejecutivo					-	-	-
1.2	Movilidad	6	6	6	0	1.057.199.952	1.057.199.952	1.057.199.952
1.2.1	Adquisición de 6 camionetas 4x4					1.018.200.000	1.018.200.000	1.018.200.000
1.2.2	Mantenimiento de 6 vehículos					-	-	-
1.2.3	Seguro vehicular para 6 unidades					38.999.952	38.999.952	38.999.952
1.3	Supervisión de obras	822	822	768	0	9.393.990.104	8.095.802.596	8.095.802.596
1.3.1	Viático					1.180.018.909	825.221.173	825.221.173
1.3.2	Combustible					596.964.049	342.004.737	342.004.737
1.3.3	Equipo de gestión y coordinación de Infraestructura					4.786.507.146	4.109.076.686	4.109.076.686
						676.000.000	665.000.000	665.000.000
						2.154.500.000	2.154.500.000	2.154.500.000
1.4	Fiscalización de obras	737	737	768	3	23.559.282.353	18.573.883.634	18.573.883.634
1.4.1	Firma fiscalizadora (Grupo 1 - 465)					19.191.282.353	17.449.794.184	17.449.794.184
1.4.2	Firma fiscalizadora (Grupo 1 - 272)					4.368.000.000	1.124.089.450	1.124.089.450
2	COMPONENTE 2: Ampliación de infraestructura y dotación de equipamiento					535.755.876.899	448.068.233.536	448.068.233.536
2.1	Obras Civiles	822	822	596	0	487.296.524.371	418.187.492.534	418.187.492.534
2.1.1	Obras (85 Locales) - Proyecto original (**)					24.018.101.479	24.018.101.479	24.018.101.479
2.1.2	Obras (465 Locales) - Proyecto Ajustado (*) (***)					344.690.595.093	336.679.892.789	336.679.892.789
2.1.3	Obras 272 - Proyecto Ajustado					114.188.710.630	57.489.498.266	57.489.498.266
2.1.4	Obras (138 locales, adicionales Expansión)					1.401.769.367	1.401.769.367	-
2.1.5	Obras (29 locales - adicionales PROCEMA-IFD)					2.997.347.802	2.997.347.802	-

2.2	Equipamiento	822	822	483	0	48.459.352.528	29.880.741.002	29.880.741.002
2.2.1	Equipamiento de 822 locales					48.459.352.528	29.880.741.002	29.880.741.002
3	COMPONENTE 3:					3.522.857.156	2.989.657.156	96.800.000
3.1	Auditoría financiera y de gestión	6	5	4	-	630.000.000	96.800.000	96.800.000
3.2	Auditoría técnica de obras	301	301	0	-	2.292.857.156		
3.3	Transferencia al proyecto "Apoyo operativo "	1	2	2	-	-	-	-
3.3.1	Gestión equipo							
3.3.2	Gestión administrativa y logística							
3.4	Transferencia para rendición y monitoreo externo FEEI (Resolución N°20/2015)					600.000.000	600.000.000	

*La ejecución registrada corresponde a lo obligado en el SICO

COMENTARIOS COMITÉ TÉCNICO FEEI

COMPONENTE	PRINCIPALES COMENTARIOS																				
C1: Relevamiento, fiscalización y gestión de obras	<p>FISCALIZACIÓN</p> <p>Se solicita a la Universidad Nacional de Caaguazú, UNCA, contratada para fiscalizar algunos lotes, introducir mejoras en los procedimientos administrativos y ejecutivos de manera a evitar atrasos en el pago de certificados.</p> <p>Se detectan falencias tales como: retrasos en el procesamiento de las documentaciones, calidad de la documentación emitida, debe haber más especificidad por tipo de situación. Los criterios aplicados por la fiscalización distan en varias ocasiones, de lo que determinan las documentaciones como: PBC, CGC, reglamentos de fiscalización, etc. Poca rotación en los sitios de obras, se evidencia que la fiscalización no es diaria.</p>																				
C2: Ampliación, reposición y equipamiento de la infraestructura escolar	<p>Avance acumulado a agosto de 2022 se resume en el cuadro:</p> <table> <tr> <th>Estado actual de la institución</th><th>Cantidad</th></tr> <tr> <td>A iniciar</td><td>8</td></tr> <tr> <td>A reactivar</td><td>79</td></tr> <tr> <td>Suspendidas</td><td>68</td></tr> <tr> <td>A ser remplazadas</td><td>1</td></tr> <tr> <td>En ejecución</td><td>73</td></tr> <tr> <td>Con recepción provisoria</td><td>42</td></tr> <tr> <td>Con recepción definitiva</td><td>78</td></tr> <tr> <td>Inscriptas en el patrimonio del MEC</td><td>476</td></tr> <tr> <td>TOTAL</td><td>826</td></tr> </table>	Estado actual de la institución	Cantidad	A iniciar	8	A reactivar	79	Suspendidas	68	A ser remplazadas	1	En ejecución	73	Con recepción provisoria	42	Con recepción definitiva	78	Inscriptas en el patrimonio del MEC	476	TOTAL	826
Estado actual de la institución	Cantidad																				
A iniciar	8																				
A reactivar	79																				
Suspendidas	68																				
A ser remplazadas	1																				
En ejecución	73																				
Con recepción provisoria	42																				
Con recepción definitiva	78																				
Inscriptas en el patrimonio del MEC	476																				
TOTAL	826																				

	<p>A iniciar: 6 locales del lote 7, adjudicada a la empresa Aponte Latorre, localizados en el Departamento de Itapúa, correspondiente a la licitación inicial de 272 establecimientos. No se ejecutan los pagos correspondientes por los certificados impagos atrasados hasta la fecha; y 2 locales del lote 4, adjudicados a la empresa Sendero, localizados en el Departamento del Guairá, correspondiente a la misma licitación adjudicada.</p> <p>A reactivar: de la licitación adjudicada de 272 establecimientos, respecto a la rescisión con la empresa EISA, con 79 establecimientos en 4 departamentos, a finales del semestre se publicó un nuevo llamado a licitación, adjudicado en agosto.</p> <p>Suspendidas: 44 locales corresponden a lo adjudicado a la empresa Engineering la licitación adjudicada de 272 establecimiento, obras suspendidas a la espera de adición de ítems e inhabilitada por la DNCP hasta diciembre del 2022, en los departamentos de: Misiones: 14 locales, 14 de Central y 16 de Capital; Además, 12 locales adjudicados a la empresa Sendero, con solicitud de suspensión a partir de mayo 2022; y 12 locales del Consorcio Norteño, obras suspendidas por adición de ítem a partir de agosto 2021.</p> <p>A ser reemplazada: el colegio técnico agropecuario Ing. Hernando Bertoni, será reemplazado por la falta de título de propiedad.</p> <p>Los procesos judicializados de obra no registran avances de solución, con las empresas constructoras; ITASA y BGF. Igual situación con las empresas fiscalizadoras para el consorcio INGSER Gorostiaga XYZ; CIALPA y RED DE INGENIERIA S.A, no registran avances.</p> <p>Equipamiento: Pendiente el llamado para 339 instituciones escolares, previstas en el PAC para marzo del 2022.</p>
C3: Evaluación y monitoreo	<p>Auditoría financiera y de gestión: Siguen pendientes las auditorías desde el año 2019, 2020, y 2021.</p> <p>Auditoría técnica de obras (30% muestreo): al cierre del semestre recién se adjudicó.</p>

PRINCIPALES CONSIDERACIONES DEL COMITÉ TÉCNICO:

- El proyecto finaliza en junio de 2023, estimando el cierre administrativo por lo menos un trimestre antes y son 156 establecimientos con obras pendientes.
- De las 822 son 476 los establecimientos con obras finalizadas (incluye registro en el patrimonio), el 57% y queda menos de un año para cumplir el plazo.
- Son 339 establecimientos que aún no cuentan con provisión de equipamientos, que no se han aún adquiridos/licitados.
- No se realizaron las auditorías externas de los años 2019, 2020 y 2021.
- La auditoría forense de obras debe contar con un plan que garantice la finalización en plazo.
- Ante la evidencia de la mala calidad de la fiscalización desde UNCA (Universidad Nacional de Caaguazú) deberían tomarse medidas más rigurosas y legales para garantizar el buen desempeño y/o el resarcimiento por incumplimiento.
