PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE COLEGIOS TÉCNICOS DE EDUCACIÓN MEDIA DEL SECTOR OFICIAL, A NIVEL PAÍS -PROMIE


OBJETIVO: Invertir en la infraestructura de colegios técnicos de la educación media de gestión oficial, para mejorar las condiciones de aprendizaje que contribuyan a la calidad de la oferta.

DATOS GENERALES

Periodo reportado	Desde: 01/01/2022	Hasta: 30/06/2022
Unidad ejecutora	Ministerio de Educación y Ciencias – MEC	
Recursos aprobados	© 202.172.259.397	
Fecha de inicio	28/01/2022	Fecha de finalización 31/7/2025 - Según Resolución CAFEEI N.º 01/2022

ESTADO DEL PROYECTO

Gráfico 1: Recursos aprobados, comprometidos y ejecutados acumulados al 30/06/2022 en © Gráfico 2: Recursos aprobados y ejecutados acumulados al 30/06/2022 en ©

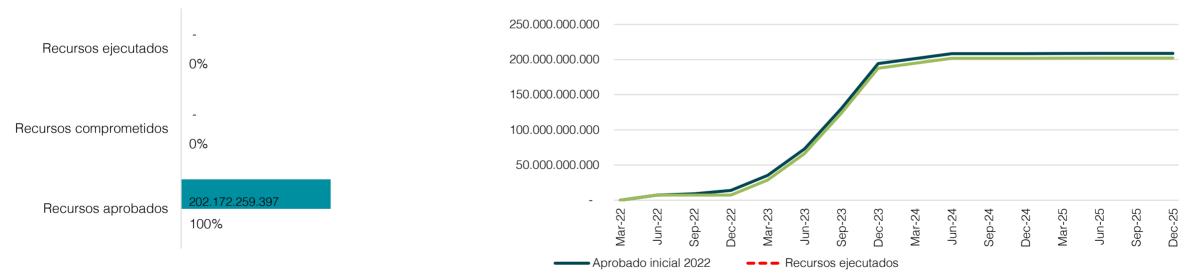

^{*}La ejecución registrada corresponde a lo efectivamente pagado por la Agencia Financiera de Desarrollo AFD (fiduciario)

Agosto 2022 Página 1

RESUMEN DE METAS FÍSICAS Y MONTOS EJECUTADOS* POR COMPONENTES Y ACTIVIDADES AL 30/06/22EN @

EDT	COMPONENTES / PRODUCTOS	METAS DEL PROGRAMA	METAS ACUMULADAS PLANIFICADAS	METAS ACUMULADAS LOGRADAS	METAS LOGRADAS EN EL SEMESTRE	RECURSOS APROBADOS	RECURSOS COMPROMETIDOS ACUMULADOS	RECURSOS EJECUTADOS ACUMULADOS
TOTAL, PROGRAMA/PROYECTO						202.172.259.397		
	Componente 1: Construcción y reparación de la infraestructura de los colegios técnicos bajo criterios de norma de seguridad y estándares de calidad.							
A.1	Relevamiento edilicio y proyecto de obras	151	-			3.561.487.328		
A.1.1	Viáticos supervisión de proyecto/entrega de sitio	-	-			18.487.328		
A.1.2	Consultoría de relevamiento edilicio y proyecto ejecutivo		-			3.322.000.000		
A.1.3	Equipo de gestión coordinación de proyectos de infraestructura- supervisión de proyectos	-	-			221.000.000		
A.2	Construcción y reparación de obras- 151 EE	151	-			133.855.272.486		
A.2.1	Obras 151 locales	-	-			121.686.611.351		
A.2.2	Reparaciones (10% del costo de obras)	-	-			12.168.661.135		
A.3	Supervisión de obras	151	-			2.240.109.285		
A.3.1	Viáticos	-	-			166.385.952		
A.3.2	Alquiler de vehículos	-	-			1.263.390.000		
A.3.3	Equipo de gestión de proyectos y supervisión de obras	-	-			810.333.333		
A.4	Fiscalización de obras	151	-			6.507.158.175		
A.4.1	Firma consultora de fiscalización para 151 EE		-			6.507.158.175		
Compo	Componente 2: Dotación de equipamiento y mobiliario según requerimiento de cada especialidad técnica.							
A.1	Adquisición de mobiliario, materiales, equipamientos e insumos.	151	-			54.000.403.036		
A.1.1	Mobiliario de 151 EE		-			12.150.403.036		
A.1.2	Materiales, equipamiento e insumos (transferencia de gratuidad).		-			41.850.000.000		
Compo	Componente 3: Evaluación, seguimiento y monitoreo							
A.1	Auditoría financiera y de gestión-2022 a 2025	4	-			669.276.362		
A.2	Auditoría técnica de construcción 151 EE (30% muestreo)	46	-			1.338.552.725		
A.3	Transferencia al proyecto "Apoyo Operativo" **	-	-			-		
A.3.1	Gestión equipo transversal de la coordinación					-		
A.3.2	Gestión administrativa y logística	-	-			-		
A.4	Transferencia monitoreo externo y rendición de cuentas del Fondo.	1	-			-		
	TOTAL, PROYECTO							

^{*}La ejecución registrada corresponde a lo obligado en el SICO

PRINCIPALES COMENTARIOS DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FEEI

Según la ruta crítica del proyecto, cuentan con un semestre de atraso en el arranque.

Agosto 2022 Página 2

^{**}Monto modificado del proyecto- Resolución CAFFEI Nº 08-29/04/2022- Transferencia al fondo de monitoreo externo y rendición de cuentas.
