PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE COLEGIOS TÉCNICOS DE EDUCACIÓN MEDIA DEL SECTOR OFICIAL, A NIVEL PAÍS (PROMIE)

OBJETIVO: Invertir en la infraestructura de colegios técnicos de la educación media de gestión oficial, para mejorar las condiciones de aprendizaje que contribuyan a la calidad de la oferta.

DATOS GENERALES

Periodo reportado	Desde: 01/07/2022	Hasta: 31/12/2022			
Unidad ejecutora	Ministerio de Educación y Ciencias – MEC				
Recursos aprobados	© 202.172.259.397				
Fecha de inicio	28/01/2022	Fecha de finalización 31/7/2025 - Según Resolución CAFEEI N.º 01/2022			

ESTADO DEL PROYECTO

Gráfico 1: Recursos aprobados, comprometidos y ejecutados* acumulados al 31/12/2022


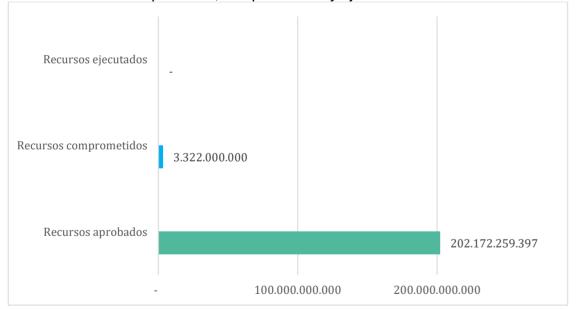


Gráfico 2: Recursos aprobados y ejecutados acumulados al 31/12/2022 en 6

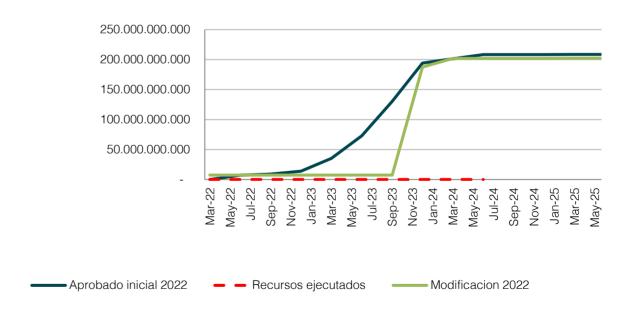

^{*}La ejecución registrada corresponde a lo efectivamente pagado por la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD, fiduciario)

Febrero 2023 Página 1

RESUMEN DE METAS FÍSICAS Y MONTOS EJECUTADOS* POR COMPONENTES Y ACTIVIDADES AL 31/12/22 EN ©

EDT	COMPONENTES / PRODUCTOS	METAS DEL PROGRAMA	METAS ACUMULADAS PLANIFICADAS	METAS ACUMULADAS LOGRADAS AL	METAS LOGRADAS EN EL SEMESTRE	RECURSOS APROBADOS	RECURSOS COMPROMETIDOS ACUMULADOS	RECURSOS EJECUTADOS ACUMULADOS
TOTAL, PROGRAMA/PROYECTO							3.322.000.000	
Componente 1: Construcción y reparación de la infraestructura de los colegios técnicos bajo criterios de norma de seguridad y estándares de calidad.							3.322.000.000	
A.1	Relevamiento edilicio y proyecto de obras	151	-			3.561.487.328	3.322.000.000	
A.1.1	Viáticos supervisión de proyecto/entrega de sitio	-	-			18.487.328		
A.1.2	Consultoría de relevamiento edilicio y proyecto ejecutivo		=			3.322.000.000		
A.1.3	Equipo de gestión coordinación de proyectos de infraestructura-supervisión de proyectos	-	-			221.000.000		
A.2	Construcción y reparación de obras- 151 EE	151	-			133.855.272.486		
A.2.1	Obras 151 establecimientos escolares	-	-			121.686.611.351		
A.2.2	Reparaciones (10% del costo de obras)	-	-			12.168.661.135		
A.3	Supervisión de obras	151	-			2.240.109.285		
A.3.1	Viáticos	-	-			166.385.952		
A.3.2	Alquiler de vehículos	-	-			1.263.390.000		
A.3.3	Equipo de gestión de proyectos y supervisión de obras	-	-			810.333.333		
A.4	Fiscalización de obras	151	-			6.507.158.175		
A.4.1	Firma consultora de fiscalización para 151 EE		-			6.507.158.175		
Comp	Componente 2: Dotación de equipamiento y mobiliario según requerimiento de cada especialidad técnica.							
A.1	Adquisición de mobiliario, materiales, equipamientos e insumos.	151	-			54.000.403.036		
A.1.1	Mobiliario de 151 EE		-			12.150.403.036		
A.1.2	Materiales, equipamiento e insumos (transferencia de gratuidad).		-			41.850.000.000		
Comp	Componente 3: Evaluación, seguimiento y monitoreo							
A.1	Auditoría financiera y de gestión-2022 a 2025	4	-			669.276.362		
A.2	Auditoría técnica de construcción 151 EE (30% muestreo)	46	-			1.338.552.725		
A.3	Transferencia al proyecto "Apoyo Operativo" **	-	-			-		
A.3.1	Gestión equipo transversal de la coordinación	_						
A.3.2	Gestión administrativa y logística	-	-			-		
A.4	Transferencia monitoreo externo y rendición de cuentas del Fondo.	1	-			-		
	TOTAL, PROYECTO							

^{**}Monto modificado del proyecto- Resolución CAFFEI Nº 08-29/04/2022- Transferencia al fondo de monitoreo externo y rendición de cuentas.

Febrero 2023 Página 2

PRINCIPALES CONSIDERACIONES

• La adjudicación de la consultoría de relevamiento edilicio y proyecto ejecutivo fue impugnada por la DNCP, dando a lugar la protesta y debe reiniciarse la evaluación, lo que acarrea más retrasos. El proyecto debió iniciar sus actividades en enero del 2023, por lo que ya tiene profesionales contratados desde esa fecha. Se debería reorganizar el plan de implementación y la disponibilidad de los profesionales contratados.

Febrero 2023 Página 3
